


## LE CHANTIER DE RÉNOVATION DE L'ÎLOT VÉGA A DÉMARRÉ EN AVRIL DERNIER. Aujourd'hui, où en est-il ? PETIT POINT D'AVANCEMENT.

Les travaux de rénovation de l'Îlot Vega se déroulent en 3 phases. Ils ont débuté en avril 2011 et s'achèveront à l'été 2012. Actuellement, les entreprises terminent la phase A et poursuivent la phase B démarrée fin août. Un grand nombre d'interventions ont déjà été effectuées ou sont en cours de réalisation :

- Déconstruction des ascenseurs place de Brazzaville et installation de la base de vie
- Retrait des végétaux et de la terre dans les grandes jardinières du futur jardin des jeux
- Démolition des matériaux de surface (nécessaire pour refaire l'étanchéité) et réalisation de la nouvelle étanchéité
- Reconstruction des formes de pente et séchage
- Pose des revêtements de sol
- Relogement des locataires des places de stationnement impactées par ces travaux

### LES TRAVAUX SE TERMINENT SUR LA PHASE A.

- Création des systèmes d'arrosage et d'éclairage
- Implantation des jeux pour enfants sur l'espace de jeux, qui devrait s'achever fin septembre
- Installation des garde-corps en octobre
- Aménagement des espaces verts et plantation des arbres, qui interviendra en novembre, pour respecter le cycle de vie des arbres
- Réouverture de la rampe Finlay : fin septembre. La SemPariSeine vous informe que la rampe Finlay sera à nouveau fermée les 13 et 14 octobre pour la pose de l'asphalte et recommande d'emprunter la rampe Emeriau.

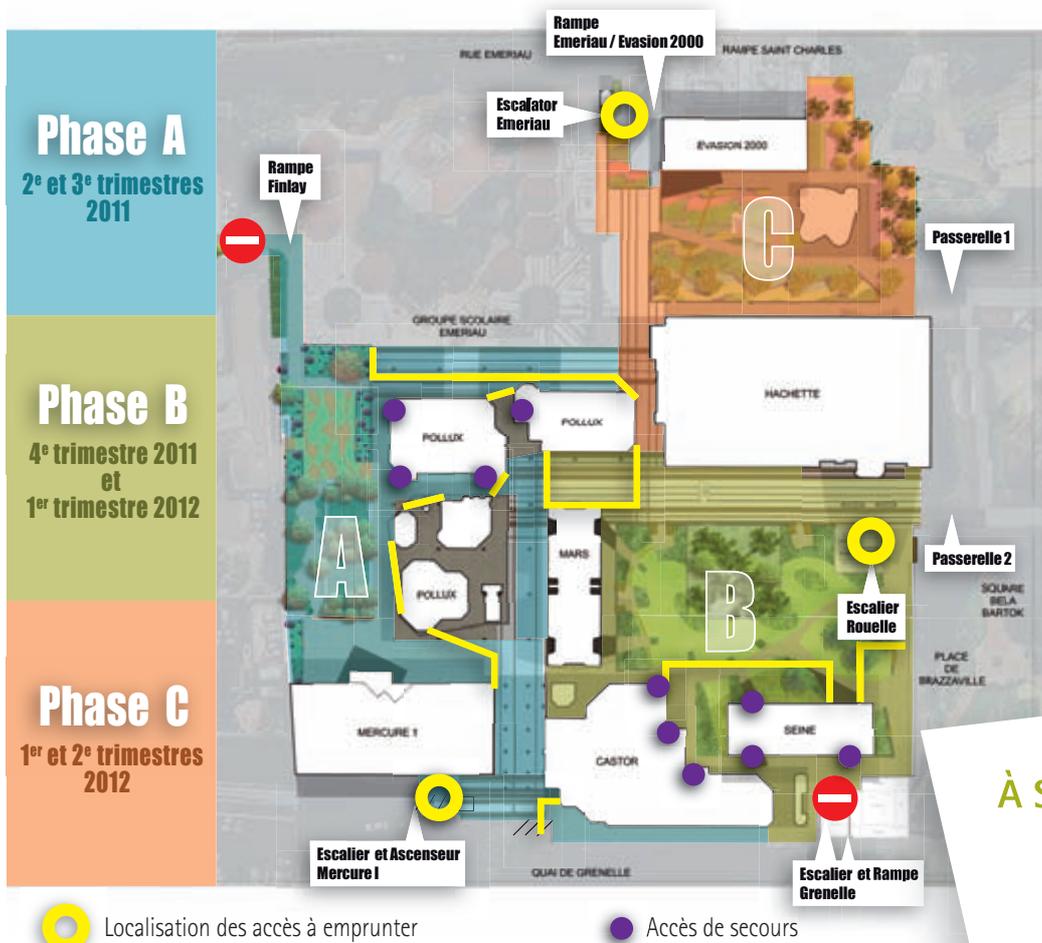

**À SAVOIR** : des visites de chantier sont organisées début octobre. Pour en savoir plus, tournez la page ! >>>

# LA SEMPARISEINE PROFITE DE LA RÉNOVATION DE L'ÎLOT VÉGA POUR FAIRE DÉCOUVRIR AUX ENFANTS LES HOMMES ET LES MÉTIERS PRÉSENTS SUR LE CHANTIER.

Les travaux de la phase A de l'îlot Vega jouxtent le groupe scolaire Emeriau. Aussi, depuis la rentrée, suite à la longue trêve estivale, les enfants passent régulièrement aux abords du chantier. Pour leur information, un panneau a été mis en place près de l'entrée du groupe scolaire Emeriau. À la fois ludique et pédagogique, il leur explique, à l'aide de courts témoignages, qui sont les hommes qui interviennent sur le chantier : maçon, carreleur, étancheur, démolisseur, chef de chantier. Une bonne manière de découvrir autrement ces personnes travaillant pour la rénovation de la dalle !



## Invitation

La SemPariSeine organise avec les entreprises de travaux deux visites de chantier sur l'Îlot Véga.

**Objectif :** vous permettre de découvrir les travaux en cours et le nouveau visage de cette partie de l'Îlot, puis répondre à vos questions.

**Rendez-vous le lundi 3 octobre,**  
**à 11h30 ou 18h30 – parvis de l'immeuble Hachette**

Cette visite, d'environ 1h, aura lieu en présence des entreprises et des chargés d'opération de la SemPariSeine.

Vous souhaitez avoir de plus amples informations sur ces visites : n'hésitez pas à nous contacter à [parisfrontdeseine@sempariseine.fr](mailto:parisfrontdeseine@sempariseine.fr) ou à vous inscrire par mail à la même adresse ou auprès de nos équipes.

La SemPariSeine œuvre pour l'insertion sociale

Le marché de travaux comporte une clause d'insertion qui exige de l'entreprise qu'elle réalise 5 % des heures travaillées avec du personnel en insertion.

—SemPariSeine—

**Contact :**

01 44 88 84 00

[parisfrontdeseine@sempariseine.fr](mailto:parisfrontdeseine@sempariseine.fr)

[www.parisfrontdeseine.fr](http://www.parisfrontdeseine.fr)
